




CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

II DIPARTIMENTO TECNICO – 2° SERVIZIO
"Patrimonio Edilizia e Manutenzione"

PROGETTO ESECUTIVO

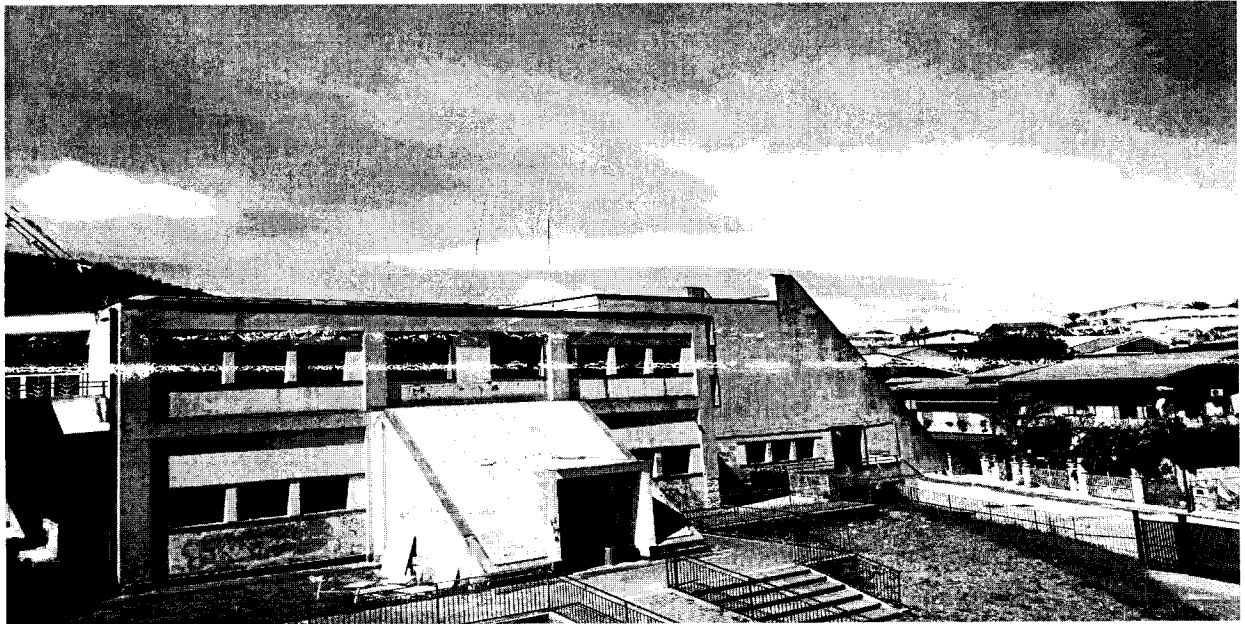

OGGETTO:	Lavori di manutenzione straordinaria presso l'IPSSAR di San Michele di Ganzaria.		
TAVOLA: 12	TITOLO ELABORATO	CRONOPROGRAMMA	
PROGETTISTA	Dott. Ing. Salvatore Nicastro 	REVISIONI	
DATA: 08/05/2018	Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Salvatore Roberti 	Il Dirigente Dott. Ing. Salvatore Roberti 	
VISTI ED APPROVAZIONI	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>RIFERIMENTO PARERE TECNICO N° 08 DEL 17/05/2018. Il Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Salvatore Roberti </p></div>		

RIEPILOGO:Prev. 03/09/2018 - 01/03/2019 = 180 gg. Giorni lavorativi Prev.126 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	SETTEMBRE/18		OTTOBRE/18		NOVEMBRE/18		DICEMBRE/18		GENNAIO/19		FEBBRAIO/19		MARZO/19	
OPERE EDILI	0,00																	
Demolizioni E Rimozioni	0,00	07/09/2018	16/09/2018	10	■	■												
	0,00																	
Lavori Edili	0,00																	
Opere Edili	0,00	17/09/2018	14/01/2019	120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Scale Emergenza	0,00	15/01/2019	08/02/2019	25									■	■	■	■	■	■
Infissi	0,00	09/02/2019	23/02/2019	15											■	■	■	■
	0,00																	
IMPIANTO ANTINCENDIO	0,00	08/10/2018	27/10/2018	20			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	0,00																	
	0,00																	
IMPIANTI (ELETTRICO E SERVOSCALA)	0,00	10/02/2019	01/03/2019	20											■	■	■	■
	0,00																	
	0,00																	
OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA	0,00	03/09/2018	01/03/2019	8	■	■											■	■
	0,00																	
	0,00																	
PARZIALI	-----					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PROGRESSIVI	-----					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MESE	-----					SETTEMBRE/18		OTTOBRE/18		NOVEMBRE/18		DICEMBRE/18		GENNAIO/19		FEBBRAIO/19		MARZO/19
